

CLIENTE		
NOME		RAZÃO SOCIAL
EMAIL		OBSERVAÇÃO
LOCAL		
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA		ENDEREÇO
ATIVO		
NOME		MARCA
MODELO		PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE /
01- APT		
DATA E HORA DE INÍCIO 11/04/2026 07:30:00	PRINCIPAIS ETAPAS DA TAREFA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO	EPIS NECESSÁRIOS KIT PADRAO
PERIGOS EXISTENTES E/OU POTENCIAIS CHOQUE ELETRICO		MEDIDAS PARA CONTROLAR PERIGOS E RISCOS DESLIGAMENTO GERAL DE ENERGIA
02- SEGURANÇA		
POSSUI KIT MITIGAÇÃO? SIM	KIT MITIGAÇÃO 	QUANTIDADE DE KIT MITIGAÇÃO 1
POSSUI EXTINTOR? SIM	EXTINTOR 	QUANTIDADE DE EXTINTOR 1
03- ATENDIMENTO		


AJUSTE DE HORIMETRO RUM ABS IGUAL AO OPERATION 	POSSUI TELEMETRIA? SIM	FOTO DA TELEMETRIA 
ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 	IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO TBRG00293	FOTO DO HORIMETRO 
HORIMETRO ATUAL 2425	CONFERIR SE A TENSÃO DO CLIENTE É A MESMA DO GERADOR E QTA OK	VERIFICAÇÃO DO FASEAMENTO DA REDE ANTES DA INSTALAÇÃO? OK
04- INSTALAÇÃO		
NIVELAMENTO DOS EQUIPAMENTOS OK	ATERRAMENTO NO QUADRO DO CLIENTE OK	CERTIFICO QUE É POSSÍVEL ABRIR TODAS AS PORTAS DO EQUIPAMENTO SIM
CERTIFICO QUE O LOCAL ATENDE AOS REQUISITOS DE ESPAÇO E VENTILAÇÃO ADEQUADOS SIM	CERTIFICO QUE O SISTEMA DE EXAUSTÃO ESTÁ ADEQUADAMENTE INSTALADO, E DIRECIONADO PARA FORA DA AREA DE INSTALAÇÃO SIM	
05- GERADOR		
TENSÃO 380	REAPERTO E DISTANCIAMENTO DE CABOS E TERMINAIS DA BASETA OK	REGULAGEM DO TRIP DO RELÊ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM
INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO DO PAINEL DE COMANDO OK	Nº DE SERIE DO CONTROLADOR (MÓDULO) 	PARALELISMO/SINCRONISMO OK
FIÇAM PORTAS ABERTAS E CONTROLADORES EXPOSTOS AO TEMPO? NÃO	GERADOR POSSUI INTERCOOLER? SIM	INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER CONFORME
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK

FOTO DA BATERIA 	VERIFIQUEI A CARGA DAS BATERIAS SIM	FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA 
FOTO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DA BATERIA 	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	MODELO DO CARREGADOR DE BATERIA 
CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK	CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	NÍVEL DO FLUIDO DO RADIADOR ESTA ACEITÁVEL? SIM
REAPERTO E TORQUEAMENTO DE PARAFUSOS DE BARRAMENTO E FINALIZAR COM MARCAÇÃO 	HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR? NÃO	VERIFIQUEI CORRETAMENTE O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO GERADOR, INCLUIDO BOMBAS D'AGUA SIM
CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE (INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. OK		
06- CABOS		
INSTALAÇÃO POSSUI CABOS? NÃO	FORAM INSTALADOS CABOS DE MÉDIA TENSÃO? NÃO	CONEXÃO DOS CABOS NO GERADOR 

CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE



CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE

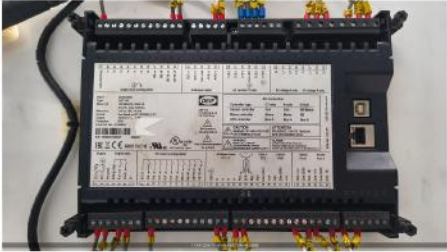

CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE



CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE



FOTO GERAL DOS CABOS



FOTO GERAL DOS CABOS



FOTO GERAL DOS CABOS



FICARAM PONTAS E EMENDAS DE CABOS EXPOSTAS

NÃO

NECESSIDADE DE PROTEÇÕES PARA PESSOAS? (PASSA CABOS, CANAFLEX)

NÃO

ENTRADA DOS CABOS NO QUADRO DO CLIENTE POSSIBILITA FECHAR A PORTA?
SIM

SOBRARAM CABOS DA INSTALAÇÃO?
NÃO

FOI IDENTIFICADA ALGUMA AVARIA NOS CABOS?
NÃO

07- DIESEL

EQUIPAMENTO COM TANQUE INTERNO

POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL?
SIM

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%)
100

HÁ VAZAMENTO DE OLEO?
NÃO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
OK

BACIA DE CONTENÇÃO
POSSUI

BACIA COM TAMPÃO DE DRENO?
SIM

FOTO DAS CONEXÕES



08- INVENTARIO

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL DIREITA



Nº DE SERIE DO MOTOR



Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



09- ACESSORIOS

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



TRANSFORMADOR
NÃO POSSUI

BACIA DE CONTENÇÃO
NÃO POSSUI

BANCO DE CARGA
NÃO POSSUI

QUADRO
POSSUI

FOTO FRONTAL



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO TRASEIRA



FOTO LATERAL DIREITA



CONTÊNER
NÃO POSSUI

CARRETA REBOQUE
NÃO POSSUI

CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) L1 3	FREQUENCIA (HZ) (3% NOMINAL) 60	PRESSÃO DO ÓLEO (4,3 ATÉ 6,5) (BAR) 6,1
TEMPERATURA DO FLUIDO (70 ATÉ 98 °C) 75	BATERIA - 01BATERIA: (12,4 ATÉ 13,0 VDC) / 02BATERIA: (24,8 ATÉ 28,5 VDC) 28,2	LOAD SPEED (%) 10
TEMPERATURA AR INTERCOOLER (°C) 45	CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) L2 7	CORRENTE (A) (+/-7%NOMINAL) L3 5
TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) L1-L2 383	TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) L2-L3 382	TENSÃO (V) (+/-7%NOMINAL) L3-L1 383
SEQUÊNCIA DE FASES ESTÁ CORRETA? (CARGAS TRIFÁSICAS FUNCIONAM?) SIM	PERMITIDO TESTE COM CARGA? SIM	VERIFICAR SE PRÉ AQUECIMENTO ESTÁ EM BOM FUNCIONAMENTO OK
HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO? NÃO	VERIFICAR RUÍDOS DO MOTOR NORMAL	VERIFICAR FOLGA DAS BORRACHAS DE ACOPLAMENTO DO ALTERNADOR OK
VIBRAÇÕES ANORMAIS OK	QTA INSTALADO E FUNCIONANDO CORRETAMENTE? SIM	CERTIFICO QUE NÃO HÁ NENHUM TIPO DE ALARME NA ECU SIM
VERIFIQUEI AS CONEXÕES E VEDAÇÕES APÓS A INSTALAÇÃO 	CERTIFICO QUE TESTEI OS DJUNTORES, PAINÉIS DE CONTROLE, MEDIDORES, E OUTROS COMPONENTES ELETRICOS SIM	VERIFIQUEI O FUNCIONAMENTO DO GERADOR COM OS DEMAIS EQUIPAMENTOS, QUE NÃO PODEM TER SEU FUNCIONAMENTO INTERROMPIDO SIM

11- CHAVES

CHAVES DO GERADOR ENTREGUE PARA O CLIENTE?
NÃO

12- OBSERVAÇÃO


FOTO 	FOTO  BASE DOS QTAS ESTÃO AO LADO DO GERADOR	OBSERVAÇÕES EQUIPAMENTOS TESTADO E TUDO EM MODO AUTOMÁTICO. FORAM GRAVADOS VÍDEOS DOS QUADROS REALIZANDO AS MANOBRAS DE TRANSFERÊNCIA, CARREGADOR DE BATERIA FUNCIONANDO.
MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO	CLIENTE INSTRUÍDO QUANTO A OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE E LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E REPOSIÇÃO CASO NECESSÁRIO? SIM	CONTATO TELEFONICO DO RESPONSÁVEL 99999999
GARANTO QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, MANUAIS DE OPERAÇÃO E REGISTRO DE MANUTENÇÃO ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADOS SIM	COMUNICAÇÃO DO MODEM DE TELEMETRIA OK	OBSERVAÇÃO TELEMETRIA FUNCIONANDO OK

FOI DADO TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO GERADOR?
NÃO

13- NEAR MISS

NEAR MISS
SEM REPORTE DE NEAR MISS

TERCEIRO DANIEL DE SOUZA MELO
11/04/2026 14:36:46



SMART MANUTENÇÃO JACÓ DE JESUS
11/04/2026 14:37:11



TERCEIRO
11/04/2026 14:36:46

