




F116 - CHECKLIST DE ALTERNADOR

CLIENTE	
NOME	RAZÃO SOCIAL
EMAIL	OBSERVAÇÃO
LOCAL	
NOME TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA	ENDEREÇO
ATIVO	
NOME	MARCA
MODELO	PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE
01- CABEÇALHO	
FOTO DO HORIMETRO	MARCA - FABRICANTE WEG
MODELO Slim	Nº DE SERIE DO ALTERNADOR 
POTÊNCIA NOMINAL 100Kva	TIPO DE CHECKLIST CHECKLIST DE LIBERAÇÃO
FOTO FECHAMENTO DA BASETA ANTES DE MEGAR 	
A) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR	


(1-4) X (2-5)
207 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

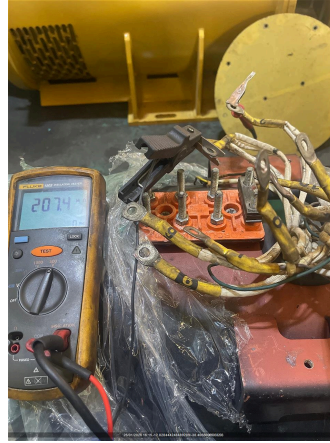


(1-4) X (3-6)
258 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

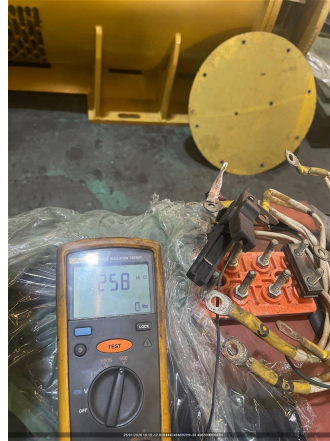


(1-4) X (8-11)
238 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

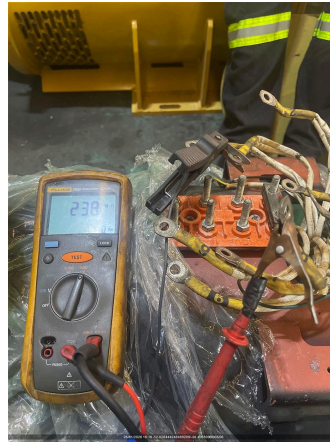

(1-4) X (7-10)
217 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

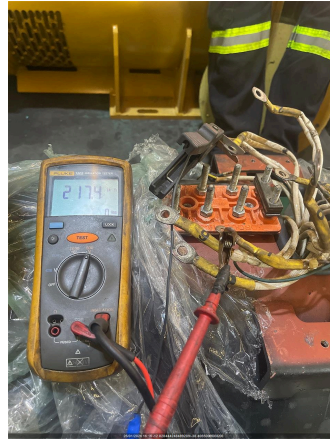

(1-4) X (9-12)
236 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(2-5) X (3-6)
315

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(2-5) X (7-10)
415 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

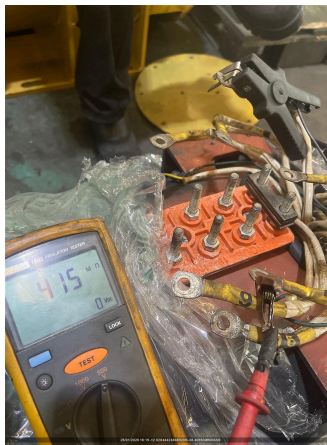


(2-5) X (8-11)
339 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

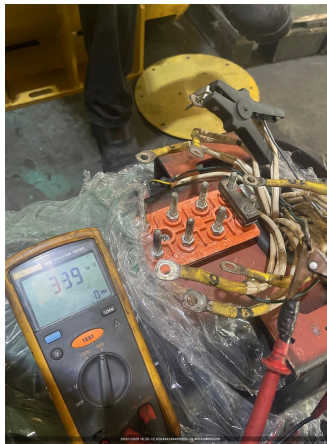


(2-5) X (9-12)
331 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

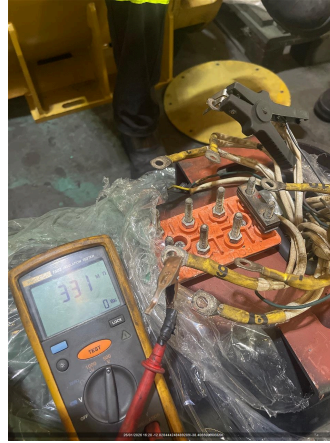


(3-6) X (7-10)
298 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

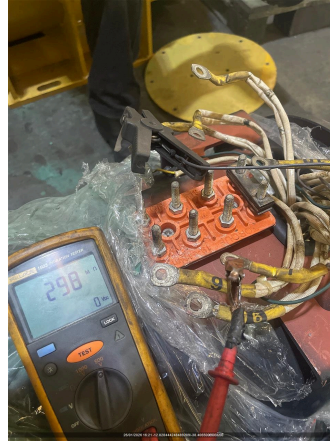


(3-6) X (8-11)
302 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

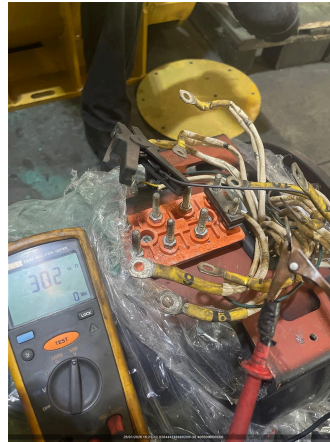

(3-6) X (9-12)
230 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

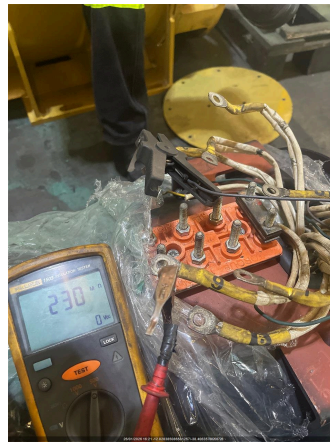


(7-10) X (8-11)
230 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO




(7-10) X (9-12)
321 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

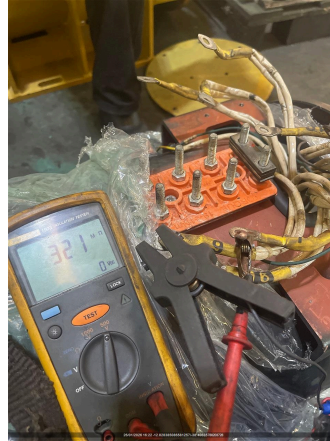

(8-11) X (9-12)
198 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

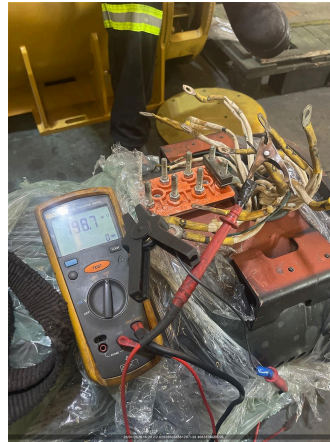


ANÁLISE
APROVADO

B) ISOLAMENTO ENTRE BOBINAS ESTATOR X CARÇAÇA

(1-4) X (T)
24 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

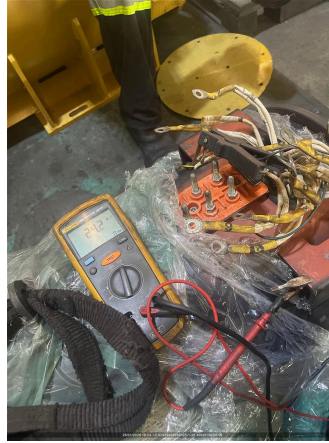


(2-5) X (T)
175 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(3-6) X (T)
203 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

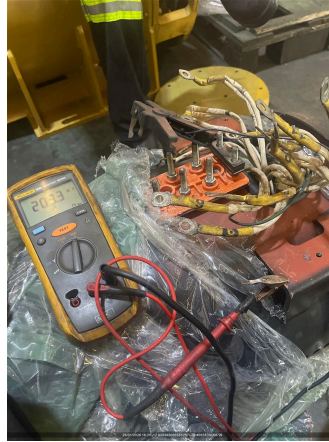


(7-10) X (T)
193 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



(8-11) X (T)
193 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

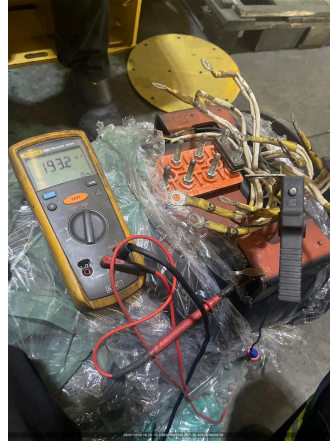

(9-12) X (T)
152 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO



ANÁLISE
APROVADO

C) RESISTÊNCIA DA BOBINA AUXILIAR

(B AUX.) X (1)
-

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (2)
-

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (3)
-

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (7)
-

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (8)
-

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (9)
-

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

(B AUX.) X (T)
-

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE
APROVADO

D) RESISTÊNCIA DO ROTOR PRINCIPAL X CARÇAÇA

(1RP) X (T)
550 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE
APROVADO

E) RESISTÊNCIA DO ESTATOR EXCITATRIZ X CARÇAÇA

(F+) X (T)
550 M

FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO

ANÁLISE
APROVADO

F) RESISTÊNCIA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) X (T)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(1) X (2)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) X (3)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) X (1)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE	

G) RESISTÊNCIA ÔHMICA DAS BOBINAS DO ESTATOR PRIN.

(1) - (4) 0.2	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(2) - (5) 0.2	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6) 0.2	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(7) - (10) 0.2	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(8) - (11) 0.2	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(9) - (12) 0.2	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	

H) RESISTÊNCIA ÔHMICA DA BOBINA AUXILIAR

(B AUX.) - (9)	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	

I) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR PRINCIPAL


1 - 2 (RP) 1.5 ohm	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	

J) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ESTATOR EXCITATRIZ

(F+) - (F-) 11.2 ohm	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	

K) RESISTÊNCIA ÔHMICA DO ROTOR EXCITATRIZ

(1) - (4) 0.4	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
------------------	--------------------------------

(2) - (5) 0.4	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
(3) - (6) 0.4	FOTO DA EVIDENCIA NO MEGOMETRO
ANÁLISE APROVADO	
L) ANÁLISE MECÂNICA	
EVIDENCIA BASETA ABERTA DURANTE A MEGAGEM 	TAMPA DIANTEIRA APROVADO
ROLAMENTO DIANTEIRO APROVADO	TAMPA TRASEIRA APROVADO
ROLAMENTO TRASEIRO APROVADO	EIXO APROVADO
VENTILADOR APROVADO	ACOPLAMENTO APROVADO
CAIXA DE LIGAÇÃO APROVADO	PLACA DE BORNE APROVADO
M) ANÁLISE ELÉTRICA	
DIODOS APROVADO	VARISTOR APROVADO
RESISTENCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO N/A	
RESUMO DOS SERVIÇOS	
ESTATOR PRINCIPAL	ROTOR PRINCIPAL
ESTATOR EXCITATRIZ	ROTOR EXCITATRIZ
OBSERVAÇÕES	CERTIFICO QUE FIZ A LIMPEZA DA BASETA DO ALTERNADOR
CERTIFICO QUE FIZ O FECHAMENTO DA BASETA APOS MEGAGEM	FOTO
