

POR: ADSON LUIS DE SANTANA SANTOS; FELIPE MATEUS DOS SANTOS CORDEIRO; -
ADSONSANTANA23012003@GMAIL.COM; FMATEUS2701@GMAIL.COM ;

EM: 08/06/2026
17:41:25

CLIENTE

PETROBRAS

LOCAL

NOME

TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA

ATIVO

NOME

MARCA

MODELO

PATRIMÔNIO / NÚMERO DE SÉRIE

01 - CABEÇALHO

DATA E HORA DE INÍCIO

06/12/2025 09:47:00

CLIENTE

RNEST PETROBRAS

FICHA

32069

TENSÃO DO CLIENTE

440V

REGIME DE OPERAÇÃO

8H

TANQUE INTERNO OU EXTERNO

TANQUE INTERNO

HORÍMETRO

SIM

ETIQUETA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA



HORÍMETRO DA ÚLTIMA PREVENTIVA

7433

FOTO DO HORÍMETRO



FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO



02 - PETROBRAS

VERIFICAR REQUISITOS DE CONTRATO

5 - F038 - PRÉ LOCAÇÃO DE GERADOR

RELATÓRIO GERADO NO [SISLOC SOFTWARES](#)

03 - RADIADOR

VERIFICAR E COMPLETAR O NÍVEL DE FLUÍDO DO RADIADOR
COMPLETO

HÁ VAZAMENTOS NO RADIADOR?
NÃO

INTEGRIDADE DA FIXAÇÃO DO RADIADOR
OK

INTEGRIDADE DE MANGUEIRAS DO INTERCOOLER
CONFORME

04 - ALTERNADOR

Nº DE SERIE DO ALTERNADOR



BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA

OK

FOTO BARRAMENTO E BASETA DOS ALTERNADORES COM TAMPA



FECHAMENTO DE TENSÃO NA BASETA



REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO
OK

FOTO REGULADOR DE TENSÃO COM TAMPA DE PROTEÇÃO



REGULADOR DE TENSÃO DEVIDAMENTE FIXADO COM PARAFUSO M5



05 - MOTOR

N° DE SERIE DO MOTOR 	NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	INTEGRIDADE DAS CORREIAS OK
--	---	---------------------------------------

06 - ELÉTRICO

INTEGRIDADE E ORGANIZAÇÃO PAINEL DE COMANDO ISENTO DE FIOS SOLTOS OK	EXISTÊNCIA DE BOTOEIRAS STOP (COGUMELO) OK	FOTO BARRAMENTO DO PAINEL COM ACRÍLICO DE PROTEÇÃO 
REGULAGEM DO TRIP DO RELÉ INTEGRADO O DISJUNTOR DE ACORDO COM A TENSÃO SIM	FORÇAR + E -2 HZ DE FREQUÊNCIA PELO CONTROLADOR OK	FORÇAR + E -10% DE AJUSTE DE TENSÃO PELO CONTROLADOR OK

07 - DIESEL

NÍVEL DE ÓLEO DIESEL (%) 20	MATERIAL DAS MANGUEIRAS APROPRIADO SIM	MANGUEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E RETORNO DO TANQUE INTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO OK
MANGUEIRAS DO TANQUE EXTERNO INTEGRAS E COM MATERIAL APROPRIADO N/A	CONEXÕES DO TANQUE EXTERNO COMPATÍVEIS COM GERADOR (EM POLEGADAS) N/A	VEDAÇÃO, REGISTROS E BUJÃO NA BACIA DE CONTENÇÃO OK
POSSUI MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTIVEL? NÃO	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL OK	CERTIFICO QUE A BACIA DE CONTENÇÃO DO TANQUE(INTERNO/EXTERNO) ESTÁ COM DRENO FECHADO E BUJÃO FIXADO. N/A

08 - CARENAGEM

É POSSIVEL VISUALIZAR O FLAP? NÃO	CONDIÇÃO DAS BORRACHAS DAS PORTAS OK	CONDIÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS OK
---	--	---

CONDIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS
OK

CONDIÇÃO DO AMORTECEDOR DAS PORTAS
COM PRESSÃO

FOTO LATERAL DIREITA



FOTO LATERAL ESQUERDA



FOTO FRONTAL



FOTO TRASEIRA



CARTÃO 3 CORES



FOTO DE ETIQUETA DE TANQUE LIMPO



CONDIÇÕES DOS ADESIVOS
BOM

CONDIÇÕES DE LIMPEZA
LIMPO

FIXAÇÃO E INTEGRIDADE DO SILENCIOSO E DOS TUBOS DE
TRANSIÇÃO DO ESCAPAMENTO
OK

FOTO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMONIO



09 - MÓDULO CONTROLADOR

POSSUI TELEMETRIA?
SIM

FOTO DA TELEMETRIA



FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA

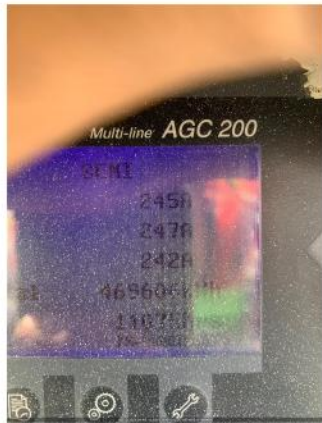


FOTO DO TESTE COM CARGA

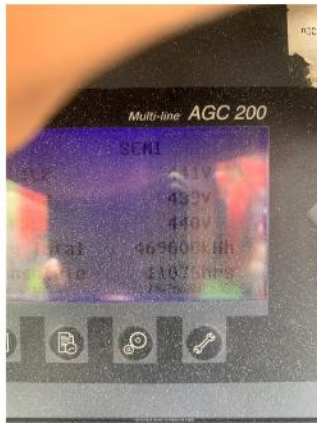


FOTO DO TESTE COM CARGA

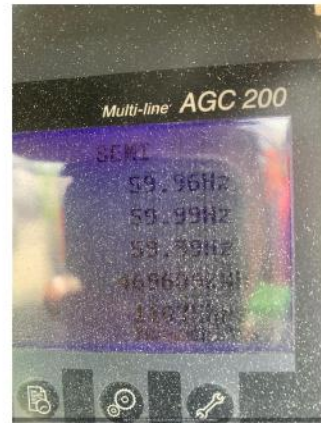


FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA

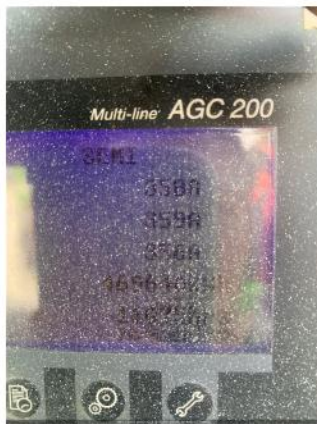


FOTO DO TESTE COM CARGA

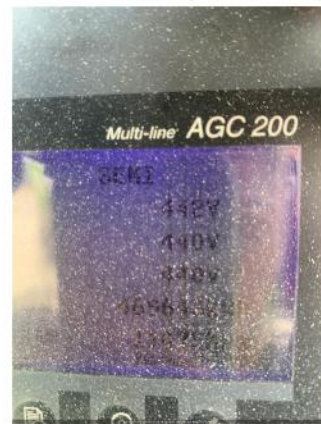


FOTO DO TESTE COM CARGA



FOTO DO TESTE COM CARGA

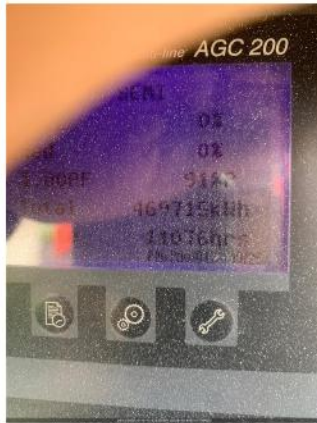


FOTO DO TESTE COM CARGA

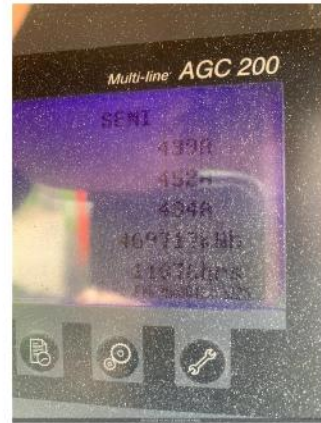
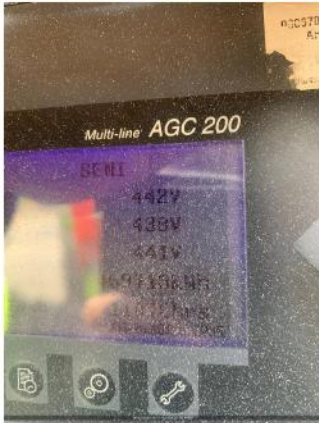
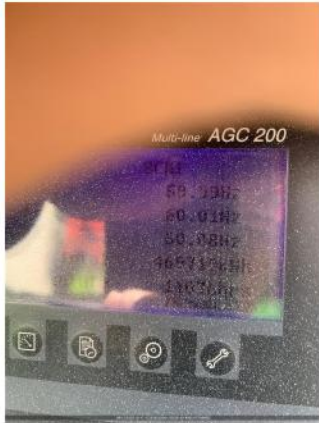


FOTO DO TESTE COM CARGA 	FOTO DO TESTE COM CARGA 	TIPO DE CONTROLADOR DEIF AGC200
O MODELO DO CONTROLADOR É SGC120? NÃO	AJUSTE DE TENSÃO DO CONTROLADOR (EM VOLTS) 440	AJUSTE DE CORRENTE DO CONTROLADOR (EM AMPERES) 664
VERIFICAR LISTA DE PROTEÇÃO PADRÃO OK	VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/FASE (V) 440	VALORES DE TENSÃO (MEDIR NA BARRA) FASE/NEUTRO (V) 254
AJUSTE DE POTÊNCIA DO CONTROLADOR (EM KILOWATTS) 369		

10 - BATERIAS/CARREGADOR DE BATERIAS

FOTO DA BATERIA 	POSSUI CARREGADOR DE BATERIA? SIM	CONDIÇÕES DO SUPORTE E FIXAÇÃO DAS BATERIAS OK
CONDIÇÃO DOS TERMINAIS DAS BATERIAS OK	TERMINAIS DA BATERIA LIVRE DE OXIDAÇÃO SIM	

11 - OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

OBSERVAÇÕES GRUPO TESTADO EM 440V COM TANQUE INTERNO; GRUPO FUNCIONOU PERFEITAMENTE APÓS TESTE DE CARGA; NÃO TEM CORTA CHAMAS NA CASA PARA QUE POSSA SER INSTALADO;	DATA E HORA DE FIM 06/12/2025 11:48:00
---	--

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

PRÉ LOCAÇÃO FELIPE CORDEIRO
06/12/2025 11:49:01

Felipe N.

PRÉ LOCAÇÃO FELIPE CORDEIRO
06/12/2025 11:49:35

Felipe N.
